3e CORRECTION DU RHÔNE
SÉCURITÉ POUR LE FUTUR

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN R3

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

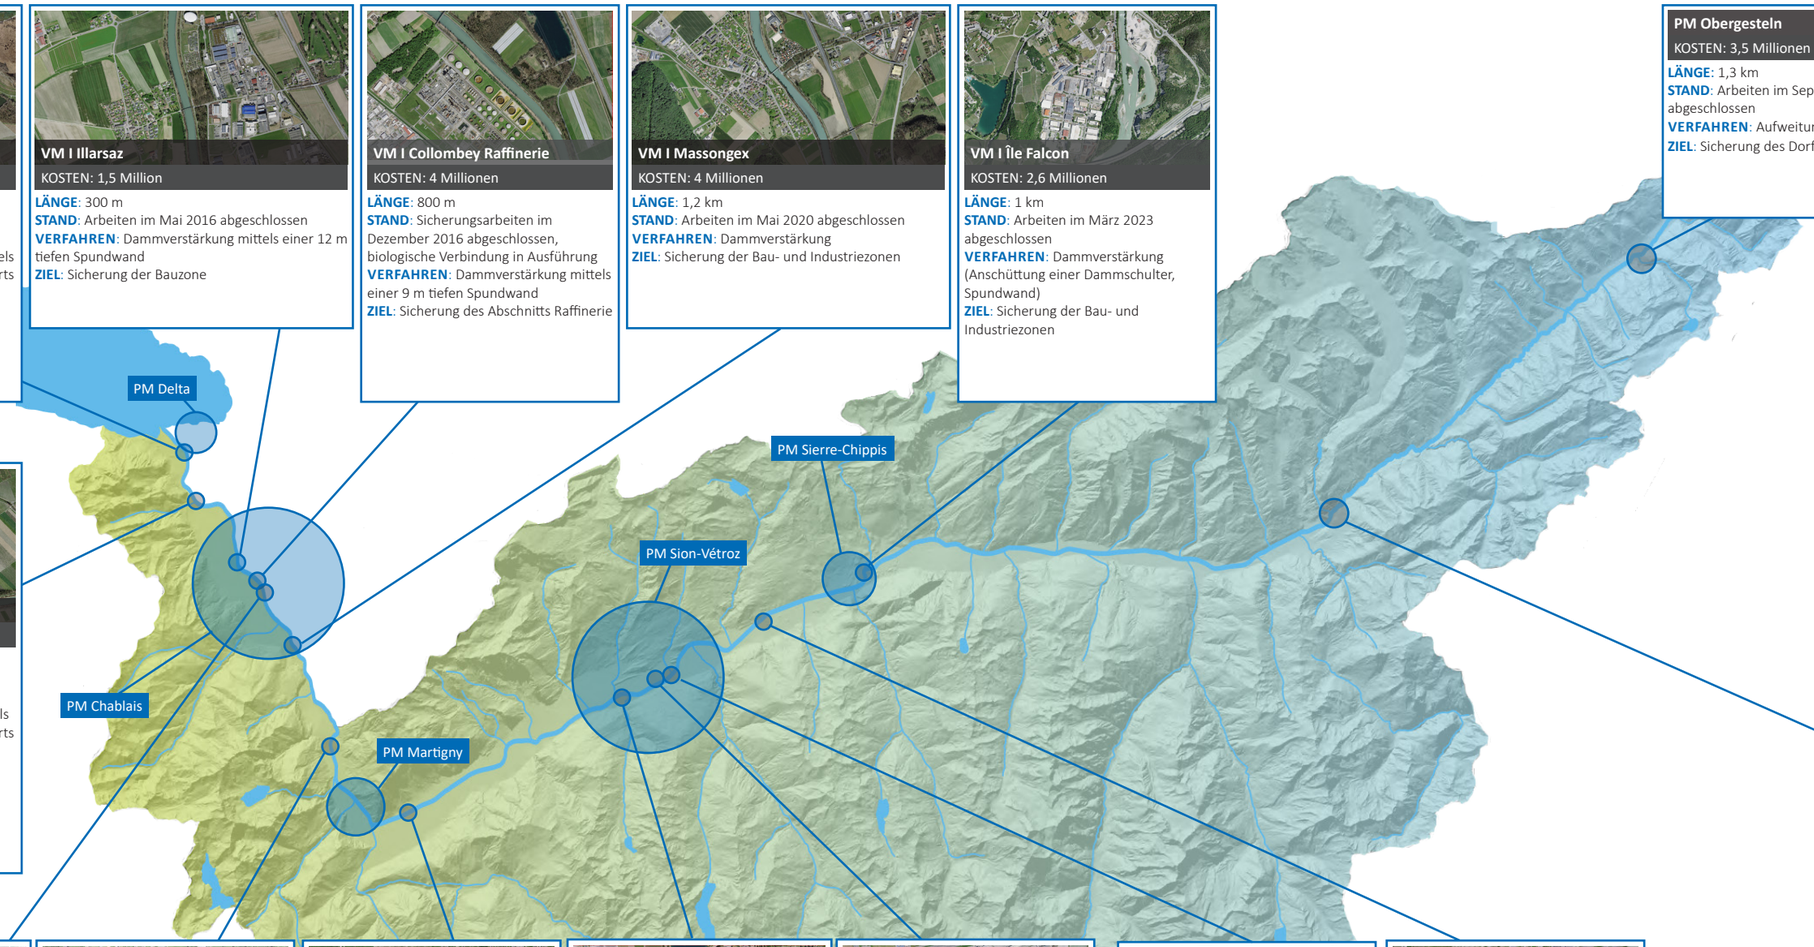



VM I Port-Valais
KOSTEN: 3 Millionen

LÄNGE: 1,5 km
STAND: Arbeiten im Juni 2016 abgeschlossen
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 6 m tiefen Dichtwand flussabwärts des Steges Region Aquapark
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

VM I Illarsaz
KOSTEN: 1,5 Million

LÄNGE: 300 m
STAND: Arbeiten im Mai 2016 abgeschlossen
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 12 m tiefen Spundwand
ZIEL: Sicherung der Bauzone

VM I Collombey Raffinerie
KOSTEN: 4 Millionen

LÄNGE: 800 m
STAND: Sicherungsarbeiten im Dezember 2016 abgeschlossen, biologische Verbindung in Ausführung
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 9 m tiefen Spundwand
ZIEL: Sicherung des Abschnitts Raffinerie

VM I Massongex
KOSTEN: 4 Millionen

LÄNGE: 1,2 km
STAND: Arbeiten im Mai 2020 abgeschlossen
VERFAHREN: Dammverstärkung
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

VM I Île Falcon
KOSTEN: 2,6 Millionen

LÄNGE: 1 km
STAND: Arbeiten im März 2023 abgeschlossen
VERFAHREN: Dammverstärkung (Anschüttung einer Dammschulter, Spundwand)
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

PM Obergesteln
KOSTEN: 3,5 Millionen

LÄNGE: 1,3 km
STAND: Arbeiten im September 2011 abgeschlossen
VERFAHREN: Aufweitungen, Verstärkungen
ZIEL: Sicherung des Dorfs

VM I Vouvry
KOSTEN: 5 Millionen

LÄNGE: 1,7 km
STAND: Arbeiten im Mai 2017 abgeschlossen
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 8 m tiefen Dichtwand flussabwärts der Brücke „Porte-du-Scex“
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

PM I Mörel-Filet (Chesteholz)
KOSTEN: 0,5 Million

LÄNGE: 400 m
STAND: Arbeiten im Mai 2010 abgeschlossen
VERFAHREN: Stabilisierung der Flusssohle
ZIEL: Sicherung der Kantonsstrasse und der MGB

VM III Grandes Iles (MAGI)
KOSTEN: 14.5 Millionen

LÄNGE: 1,7 km
STAND: Arbeiten im Dezember 2025 abgeschlossen
VERFAHREN: neues Schutzbauwerk am rechten Ufer
ZIEL : Behebung der Dammbruchgefahr, Verbesserung der ökologischen Funktionen der Rhone und Aufwertung der Raumnutzung und der gesellschaftlichen Funktionen

VM II Kiesentnahme Collonges
KOSTEN: 2,5 Millionen

LÄNGE: 1 km (ausserhalb R3)
STAND: Arbeiten im April 2016 abgeschlossen
VERFAHREN: Sohlabsenkung durch Kiesentnahme
ZIEL: Sicherung der Bauzone



VM II Fully
KOSTEN: 3,3 Millionen

LÄNGE: 3,8 km
STAND: Arbeiten im September 2019 abgeschlossen
VERFAHREN: Spundwand
ZIEL: Sicherung der Bauzone



VM I Aproz
KOSTEN: 7 Millionen

LÄNGE: 1,6 km
STAND: Sicherungsarbeiten abgeschlossen, Umweltmassnahmen Printse im Juni 2024 abgeschlossen
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 10 m tiefen Dichtwand
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

VM II Ronquoz
KOSTEN: 4 Millionen

LÄNGE: 900 m
STAND: Arbeiten im Mai 2020 abgeschlossen
VERFAHREN: Spundwand
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

VM III Unterstation H3 Sitten
KOSTEN : 2 Millionen

LÄNGE:: 300 m
STAND: Arbeiten im September 2025 abgeschlossen
VERFAHREN: Dammverstärkung durch luftseitige Auflast
ZIEL: Beseitigung der Gefahr eines Dammbruchs und Schutz des 65-kV-Unterwerks



VM I Granges
KOSTEN: 5,5 Millionen

LÄNGE: 700 m
STAND: Arbeiten im Juni 2020 abgeschlossen
VERFAHREN: Dammverstärkung mit einer Spundwand
ZIEL: Sicherung der Bauzone

Legende

VM Vorgezogene Massnahme
PM Prioritäre Massnahme
